1. Kiểm tra Increment

Mã	Bằng chứng	Kết luận
SC-61	80/80 test đạt, không lỗi cao	Done
SC-62	70/78 test đạt, còn 8 ca lỗi	Chưa Done
SC-63	74/80 ca đúng, còn 1 lỗi cao	Chưa Done
SC-64	60/60 test chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT	Chưa Done
SC-65	42/42 test đạt, quyền riêng tư đạt	Done

- Cần xác nhận rõ các điều kiện DoD: bằng chứng xác nhận Done, không vội kết luận Done dựa trên Unit Test
- Phần chưa Done cần trình bày kỹ hơn về trạng thái, lỗi có thể xảy ra, ruỉ ro tồn tại
- 2 điểm sai của Review:
    + “PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done“ -> tuyên bố sai lệch, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng
    + Biến các Review thành nghiệm thu và cam kết với mọi Feedback -> mất sự trao đổi 2 chiều, kỳ vọng quá cao không có cơ sở thực tế

2. Thiết kế Sprint Review
    - Mục tiêu: Kiểm tra Increment thực tế, thu thập Feedback và điều chỉnh PB
    - Sprint Review

Thời gian (phút)	Nội dung	Vai trò
10	Sprint Goal, công bố Done/chưa Done	PO, Dev
15	Demo DoD, giải thích phần chưa Done	Dev
20	Trao đổi, đặt câu hỏi mở, Feedback	Stakeholders, Scrum Team
10	Phân tích giá trị, rủi ro, hướng ưu tiên	PO và các bên liên quan(CSKH, vận hành,..)
5	Tổng kết Feedback và hướng đi tiếp theo	PO

- Câu hỏi mở:
    + Điều gì khiến CSKH xử lý hội thoại chậm?
    + Thông tin nào còn thiếu?
    + Chức năng nào cần ưu tiên nhất và vì sao?
- Feedback Log

ID	Nguồn	Bằng chứng	Điểm cần rõ và Hướng xử lý
F-01	Stakeholder	Đề xuất tự động hóa 90%	Làm rõ cách đo, khảo sát tính khả thi
F-02	CSKH	Yêu cầu chuyển sớm	Xác định mốc chuyển, đánh giá SLA 2 phút
F-03	Kiểm tra quyền riêng tư	Phản ánh còn SĐT	Xác định màn hình, kiểm tra riêng tư, ưu tiên xử lý
F-04	CSKH	Phản ánh thiếu lịch sử	Xác định kênh và dữ liệu thiếu, cân nhắc ưu tiên
F-05	Dev	Phản ánh lệch P95	Thu số liệu, thống nhất cách đo và ngưỡng

3. Thiết kế Sprint Retrospective

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động
Data	15	Xem dữ liệu staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, an toàn 2,8/5
Insight	20	Phân tích nguyên nhân kiểm thử muộn, thay đổi thiếu kiểm soát và tình trạng đỗ lỗi. Sử dụng 4Ls kết hợp 5 Whys
Action	15	Cả nhóm đề xuất, biểu quyết và chọn tối đa 2 hành động cải tiến có thể đo lường
Follow-up	10	Xác định nhóm theo dõi, thời hạn, bằng chứng hoàn thành và cách kiểm tra trong Sprint 15


Action	Nhóm theo dõi	Thời điểm	Bằng chứng hoàn thành
A-01: Ghi mọi thay đổi quy tắc vào Backlog, xác nhận với PO trước khi thực hiện	PO + dev	Suốt Sprint 15	100% thay đổi có ghi nhận và xác nhận
A-02: Đưa Integration Test lên trước Ngày 8, kiểm tra staging và quyền riêng tư sớm	Dev	Trước Ngày 5	Biên bản test, kết quả staging và kiểm tra riêng tư

5. Kỹ thuật Retro

Tiêu chí	Start–Stop–Continue	4Ls
An toàn tâm lý	Trung bình, dễ thành chỉ trích	Tốt hơn, khuyến khích chia sẻ
Tìm nguyên nhân	Chủ yếu nhận diện hành vi	Khám phá trải nghiệm và vấn đề sâu hơn
Hành động	Dễ chuyển thành Action	Cần thêm bước chọn Action
Thời lượng	15–20 phút	20–30 phút
Người ít nói	Có thể ít tham gia	Dễ tham gia qua viết ý kiến ẩn danh

- Chọn PP 4Ls: Điểm an toàn tâm lý chỉ 2,8/5, Retro cũ có đổ lỗi. 4Ls giúp thành viên chia sẻ vấn đề mà không tập trung chỉ trích cá nhân
- Trade-off: 4Ls tốn thời gian hơn và khó chuyển trực tiếp thành hành động
- Điều kiện thay đổi: Khi an toàn tâm lý được cải thiện, có thể chuyển sang SSC hoặc kết hợp 4Ls để tìm vấn đề và SSC để xác định hành động

5. Chu trình Inspect ànd Adapt

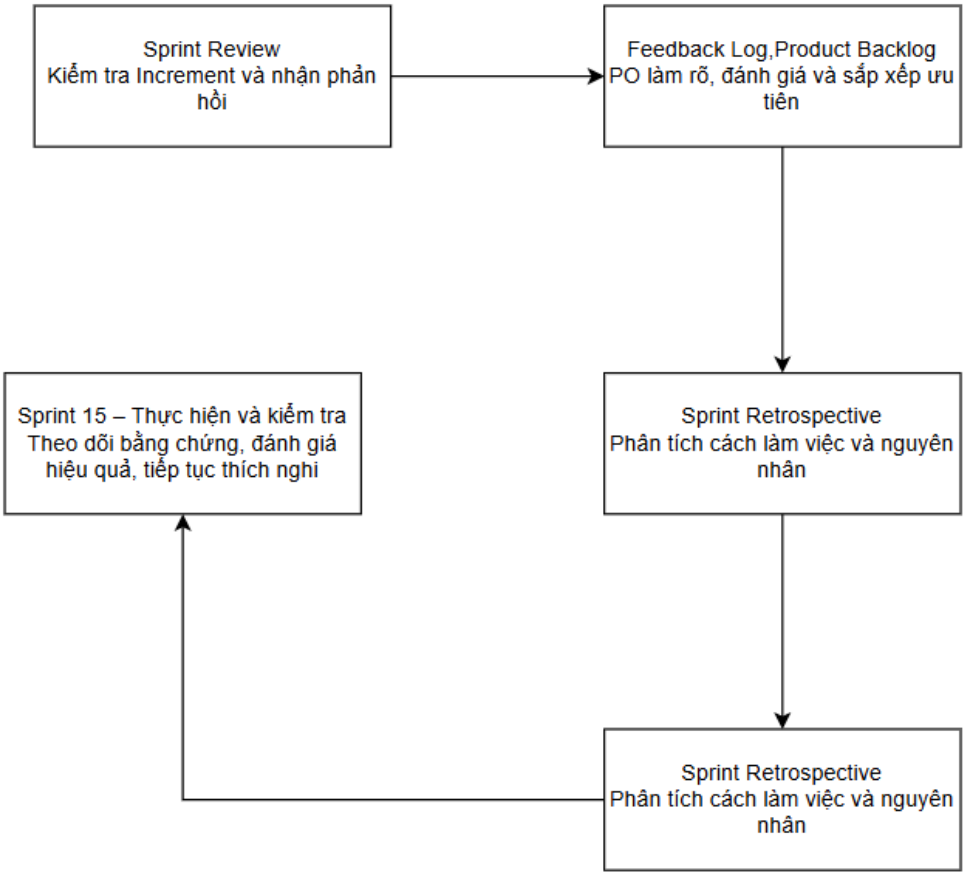

- Truy vết Feedback và Action

Nội dung	**Quyền cập nhật**	**Bằng chứng**	**Tiêu chí đo**
F-04: Thiếu lịch sử đa kênh	PO cập nhật Product Backlog	Phản hồi CSKH, các trường hợp thiếu lịch sử	Số trường hợp thiếu lịch sử được xác minh và xử lý
A-02: Kiểm thử sớm	Developers cập nhật tiến độ; Scrum Team đánh giá	Kết quả Integration Test, staging, kiểm tra riêng tư	Hoàn thành kiểm tra theo kế hoạch trước Ngày 5
